[redacted]

4. REVISIÓN DE EQUIPAMIENTO

PANEL INFORMATIVO				
UBICACIÓN	**DIAGNÓSTICO**	**TEST INICIAL**	**ACCIONES**	**ESTADO FINAL**
Panel Palmera Montero	Módulos LED: 7 unidades dañadas Ventilación: 1 equipo dañado	☒	Acometida de fuerza. Comprobación de las protecciones.	**OK**
			Comprobación funcionamiento de todas las fuentes de alimentación.	**OK**
			Comprobación de la fijación en la base.	**OK**
			Verificación de la sujeción y conexionado de todos los elementos.	**OK**
			Verificación da la activación de toda la matriz LED con sus diferentes colores.	**NO OK**
			Comprobación variación de la intensidad de brillo de los LEDs según sonda de luminosidad.	**OK**
			Verificación de la comunicación con el gestor de contenidos para la recepción de imágenes y videos con su correcta visualización.	**OK**
			Comprobación del dato de temperatura según sonda de temperatura.	**OK**
			Comprobación sistema de ventilación.	**NO OK**

PANEL INFORMATIVO				
UBICACIÓN	**DIAGNÓSTICO**	**TEST INICIAL**	**ACCIONES**	**ESTADO FINAL**
Panel Hondarribia	Módulos LED: 1 unidad dañada Ventilación: 1 equipo dañado	☒	Acometida de fuerza. Comprobación de las protecciones.	**OK**
			Comprobación funcionamiento de todas las fuentes de alimentación.	**OK**
			Comprobación de la fijación en la base.	**OK**
			Verificación de la sujeción y conexionado de todos los elementos.	**OK**
			Verificación da la activación de toda la matriz LED con sus diferentes colores.	**NO OK**
			Comprobación variación de la intensidad de brillo de los LEDs según sonda de luminosidad.	**OK**
			Verificación de la comunicación con el gestor de contenidos para la recepción de imágenes y videos con su correcta visualización.	**OK**
			Comprobación del dato de temperatura según sonda de temperatura.	**OK**
			Comprobación sistema de ventilación.	**NO OK**

PANEL INFORMATIVO				
UBICACIÓN	**DIAGNÓSTICO**	**TEST INICIAL**	**ACCIONES**	**ESTADO FINAL**
Panel Guipúzcoa	Sin anomalías relevantes	✓	Acometida de fuerza. Comprobación de las protecciones.	**OK**
			Comprobación funcionamiento de todas las fuentes de alimentación.	**OK**
			Comprobación de la fijación en la base.	**OK**
			Verificación de la sujeción y conexionado de todos los elementos.	**OK**
			Verificación da la activación de toda la matriz LED con sus diferentes colores.	**OK**
			Comprobación variación de la intensidad de brillo de los LEDs según sonda de luminosidad.	**OK**
			Verificación de la comunicación con el gestor de contenidos para la recepción de imágenes y videos con su correcta visualización.	**OK**
			Comprobación del dato de temperatura según sonda de temperatura.	**OK**
			Comprobación sistema de ventilación.	**OK**

PANEL INFORMATIVO				
UBICACIÓN	**DIAGNÓSTICO**	**TEST INICIAL**	**ACCIONES**	**ESTADO FINAL**
Panel Casino	Módulos LED: 16 uds. dañadas	☒	Acometida de fuerza. Comprobación de las protecciones.	**OK**
			Comprobación funcionamiento de todas las fuentes de alimentación.	**OK**
			Comprobación de la fijación en la base.	**OK**
			Verificación de la sujeción y conexionado de todos los elementos.	**OK**
			Verificación da la activación de toda la matriz LED con sus diferentes colores.	**NO OK**
			Comprobación variación de la intensidad de brillo de los LEDs según sonda de luminosidad.	**OK**
			Verificación de la comunicación con el gestor de contenidos para la recepción de imágenes y videos con su correcta visualización.	**OK**
			Comprobación del dato de temperatura según sonda de temperatura.	**OK**
			Comprobación sistema de ventilación.	**OK**

PANEL INFORMATIVO				
UBICACIÓN	**DIAGNÓSTICO**	**TEST INICIAL**	**ACCIONES**	**ESTADO FINAL**
Panel San Juan	Sin anomalías relevantes	✓	Acometida de fuerza. Comprobación de las protecciones.	**OK**
			Comprobación funcionamiento de todas las fuentes de alimentación.	**OK**
			Comprobación de la fijación en la base.	**OK**
			Verificación de la sujeción y conexionado de todos los elementos.	**OK**
			Verificación da la activación de toda la matriz LED con sus diferentes colores.	**OK**
			Comprobación variación de la intensidad de brillo de los LEDs según sonda de luminosidad.	**OK**
			Verificación de la comunicación con el gestor de contenidos para la recepción de imágenes y videos con su correcta visualización.	**OK**
			Comprobación del dato de temperatura según sonda de temperatura.	**OK**
			Comprobación sistema de ventilación.	**OK**

5. ACTUACIONES ESPECIALES

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	ESTADO
Paneles general	Estructuras de panel dañadas por óxido.	Lijado metal o repuesto.	Sin iniciar
Paneles general	Caja estanca circuito de mando diferenciales dañadas por óxido.	Lijado y pintado de la envolvente.	Sin iniciar

6. INCIDENCIAS RESUELTAS

ABIERTA	SOLICITANTE	Nº TICKET	DESCRIPCIÓN	NOTAS DE RESOLUCIÓN	FECHA

7. RESUMEN INCIDENCIAS ABIERTAS

INCIDENCIAS ABIERTAS DINYCON	INCIDENCIAS ABIERTAS CLIENTE	INCIDENCIAS TOTALES
0	0	0

8. EVIDENCIAS ACTUACIONES ESPECIALES, OBSERVACIONES Y MEJORAS.

1.- Se recomienda la colocación de elementos de protección contra sobretensiones en cada uno de los paneles.

2.- Se recomienda la sustitución de las controladoras por resultar modelos obsoletos.

3.- CASINO: Estado de los módulos LED de panel (16 unidades dañadas).




4.- CASINO: Se observa un deterioro en la estructura y pintado del panel.



5.- CASINO: estado caja estanca del circuito de mando diferencial.



6.- HONDARRIBIA: Estado de los módulos LED de panel (1 unidad dañada en la parte inferior izquierda).

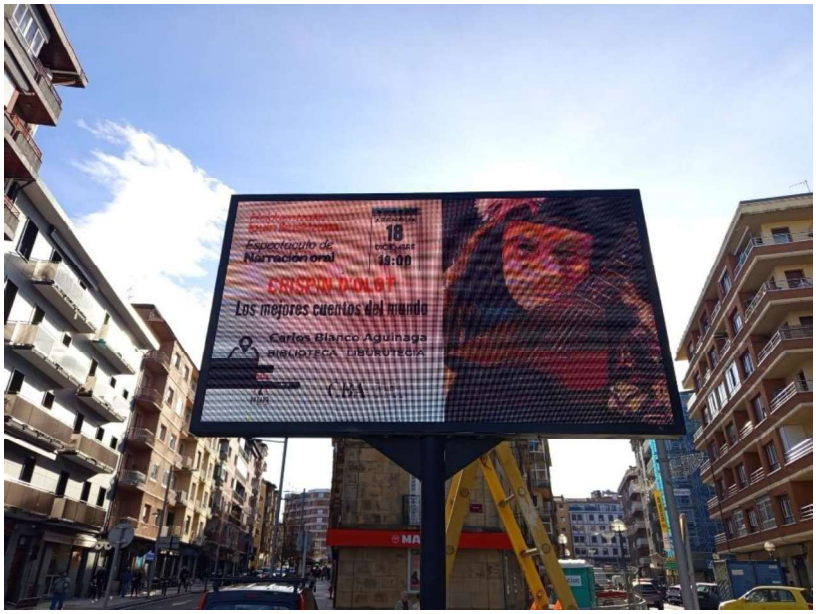

7.- HONDARRIBIA: Se observa un deterioro en la estructura y pintado del panel.





8.- PALMERA MONTERO: Estado de los módulos LED de panel (7 unidades dañadas en la parte central y superior).



9.- PALMERA MONTERO: Se observa un deterioro en la estructura y pintado del panel.





10.- PALMERA MONTERO: estado caja estanca del circuito de mando diferencial.



11.- GUIPÚZCOA: Se observa un deterioro en la estructura y pintado del panel.





12.- GUIPÚZCOA: estado caja estanca del circuito de mando diferencial.



13.- SAN JUAN: Se observa un deterioro en la estructura y pintado del panel.

